Vorläufiger Projekt-Ablaufplan; BV Ihrlerstein "Nelkenstraße und Tulpenstraße"

Nr.	Vorgangsr	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1		Ausbau Altasphalt und Erdarbeiten	20 Tage	Mon 06.05.19	Fre 31.05.19	
2		Kanalreparaturen	5 Tage	Mon 03.06.19	Fre 07.06.19	1
3		Wasserleitungsbauarbeiten	15 Tage	Mon 03.06.19	Fre 21.06.19	1
4		Glasfaser-Verrohrung	30 Tage	Mon 24.06.19	Fre 02.08.19	3
5		Kabelumlegung EON	30 Tage	Mon 24.06.19	Fre 02.08.19	3
6		Gasleitungsbau und Hausanschlüsse	15 Tage	Mon 24.06.19	Fre 12.07.19	3
7		Kabelneuverlegung EON	30 Tage	Mon 24.06.19	Fre 02.08.19	3
8		Straßensinkkästen und Drainage	15 Tage	Mon 05.08.19	Fre 23.08.19	7
9		Pflasterarbeiten	25 Tage	Mon 26.08.19	Fre 27.09.19	8
10		Schottertragschicht-Planie	10 Tage	Mon 30.09.19	Fre 11.10.19	9
11		Anpassungen Hofzufahrten	20 Tage	Mon 14.10.19	Fre 08.11.19	10
12		Asphaltarbeiten	5 Tage	Mon 11.11.19	Fre 15.11.19	11
13		Restarbeiten	5 Tage	Mon 18.11.19	Fre 22.11.19	12

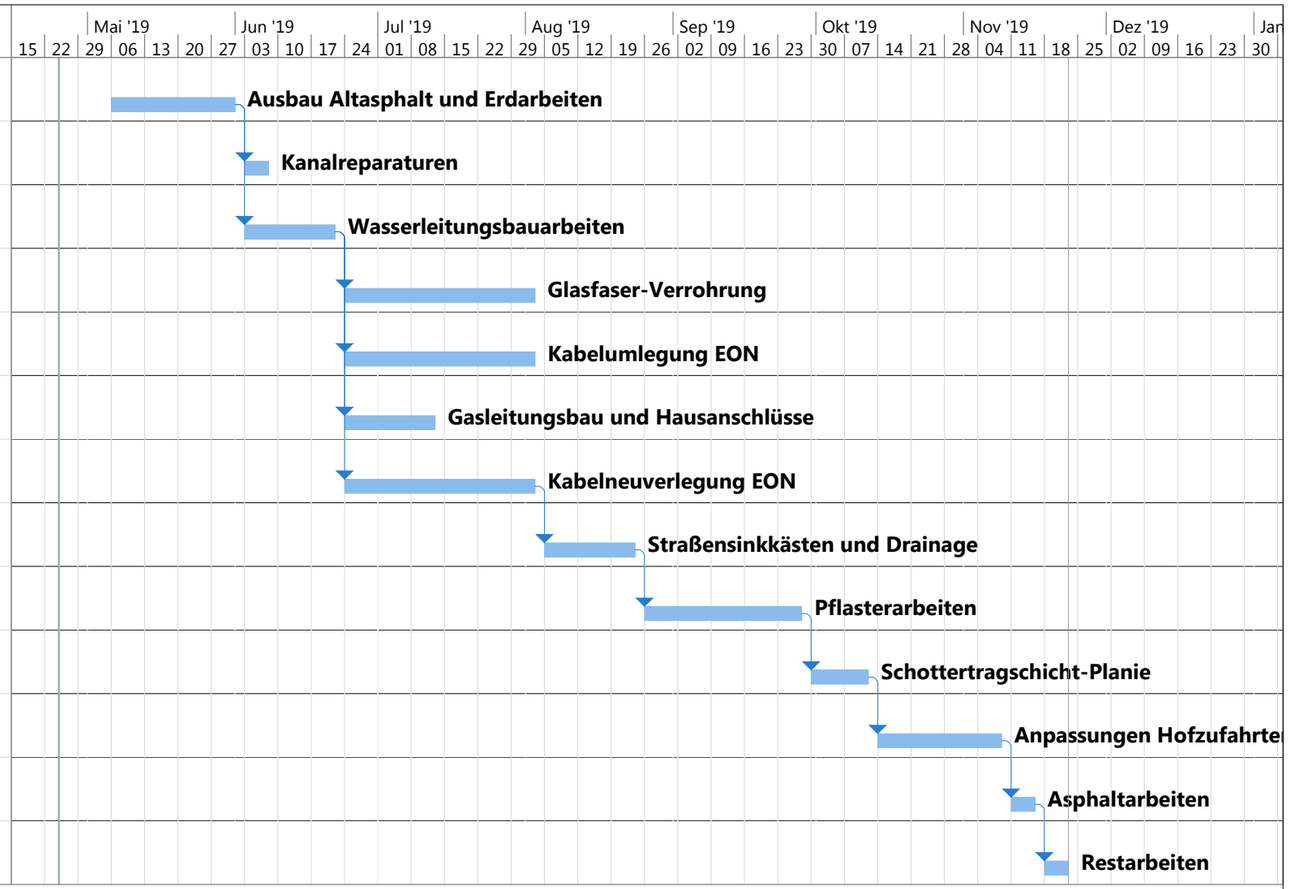

Projekt: 2019-04-25-Nelkenstr
Datum: Don 25.04.19

Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag
Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit
Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt
Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein	
